Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1	**Brunnenneubau EVS**	**161,34 Tage**	**Mit 29.06.22**
2	**Vorbereitungsarbeiten**	**61 Tage**	**Mit 29.06.22**
3	ZÜP	30 Tage	Mit 29.06.22
4	Schulungen Luftfahrtsicherheit	3 Tage	Mit 10.08.22
5	Anmeldung Luftfahrtbehörde	14 Tage	Mon 15.08.22
6	Anmeldung Flugsicherung	14 Tage	Fre 02.09.22
7	**Neubau Brunnen Br.22**	**71,17 Tage**	**Don 22.09.22**
8	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Don 22.09.22
9	Aufschlussbohrung B22	5 Tage	Die 27.09.22
10	Siebanalysen	5 Tage	Die 04.10.22
11	Ausbauplanung	2 Tage	Die 11.10.22
12	Wartezeit Ausbaumaterial	42 Tage	Don 13.10.22
13	Einrichten Baustelle (Lotung Wsp.)	3 Tage	Mon 12.12.22
14	Bohrarbeiten 0,0 bis 42,0 m u.GOK	4 Tage	Don 15.12.22
15	Einstellen Aubauverrohrung	0,5 Tage	Mit 21.12.22
16	Verkiesung Ringraum	0,5 Tage	Mit 21.12.22
17	Einbau Tonsperre	0,66 Tage	Don 22.12.22
18	Einrichtung Brunnenentwicklung	0,33 Tage	Don 22.12.22
19	Klarpumpen	0,5 Tage	Don 22.12.22
20	Entsandung	1,25 Tage	Fre 23.12.22
21	Absaugen	0,5 Tage	Mon 26.12.22
22	Einrichtung Pumpversuch	0,33 Tage	Die 27.12.22
23	Einbau Datenlogger	0,1 Tage	Die 27.12.22
24	Pumpversuch (4-stufig)	1,25 Tage	Die 27.12.22
25	Messung Wiederanstieg	0,25 Tage	Mit 28.12.22
26	Geophysikalische Vermessung	1 Tag	Don 29.12.22
27	**Neubau Brunnen Br.23**	**92,34 Tage**	**Die 04.10.22**
28	Aufschlussbohrung B23	5 Tage	Die 04.10.22
29	Siebanalyse	5 Tage	Die 11.10.22
30	Ausbauplanung	2 Tage	Die 18.10.22
31	Wartezeit Ausbaumaterial	42 Tage	Don 20.10.22
32	Einrichten Baustelle (Lotung Wsp.)	3 Tage	Fre 30.12.22
33	Bohrarbeiten 0,0 bis 42,0 m u.GOK	4 Tage	Mit 04.01.23
34	Einstellen Aubauverrohrung	0,5 Tage	Die 10.01.23
35	Verkiesung Ringraum	0,5 Tage	Die 10.01.23
36	Einbau Tonsperre	0,66 Tage	Mit 11.01.23
37	Einrichtung Brunnenentwicklung	0,33 Tage	Mit 11.01.23
38	Klarpumpen	0,5 Tage	Don 12.01.23
39	Entsandung	1,25 Tage	Don 12.01.23
40	Absaugen	0,5 Tage	Fre 13.01.23
41	Einrichtung Pumpversuch	0,33 Tage	Mon 16.01.23
42	Einbau Datenlogger	0,1 Tage	Mon 16.01.23
43	Pumpversuch (4-stufig)	1,25 Tage	Mon 16.01.23
44	Messung Wiederanstieg	0,25 Tage	Mit 18.01.23
45	Geophysikalische Vermessung	1 Tag	Mit 18.01.23
46	Baugrube für 2 Schächte herstellen	4 Tage	Don 19.01.23
47	Brunnenabschlussbauwerke	4 Tage	Mit 25.01.23
48	Verfüllen und Verdichten für 2 Brunnen	2 Tage	Die 31.01.23
49	Elektroinstallation für 2 Brunnen	5 Tage	Don 02.02.23

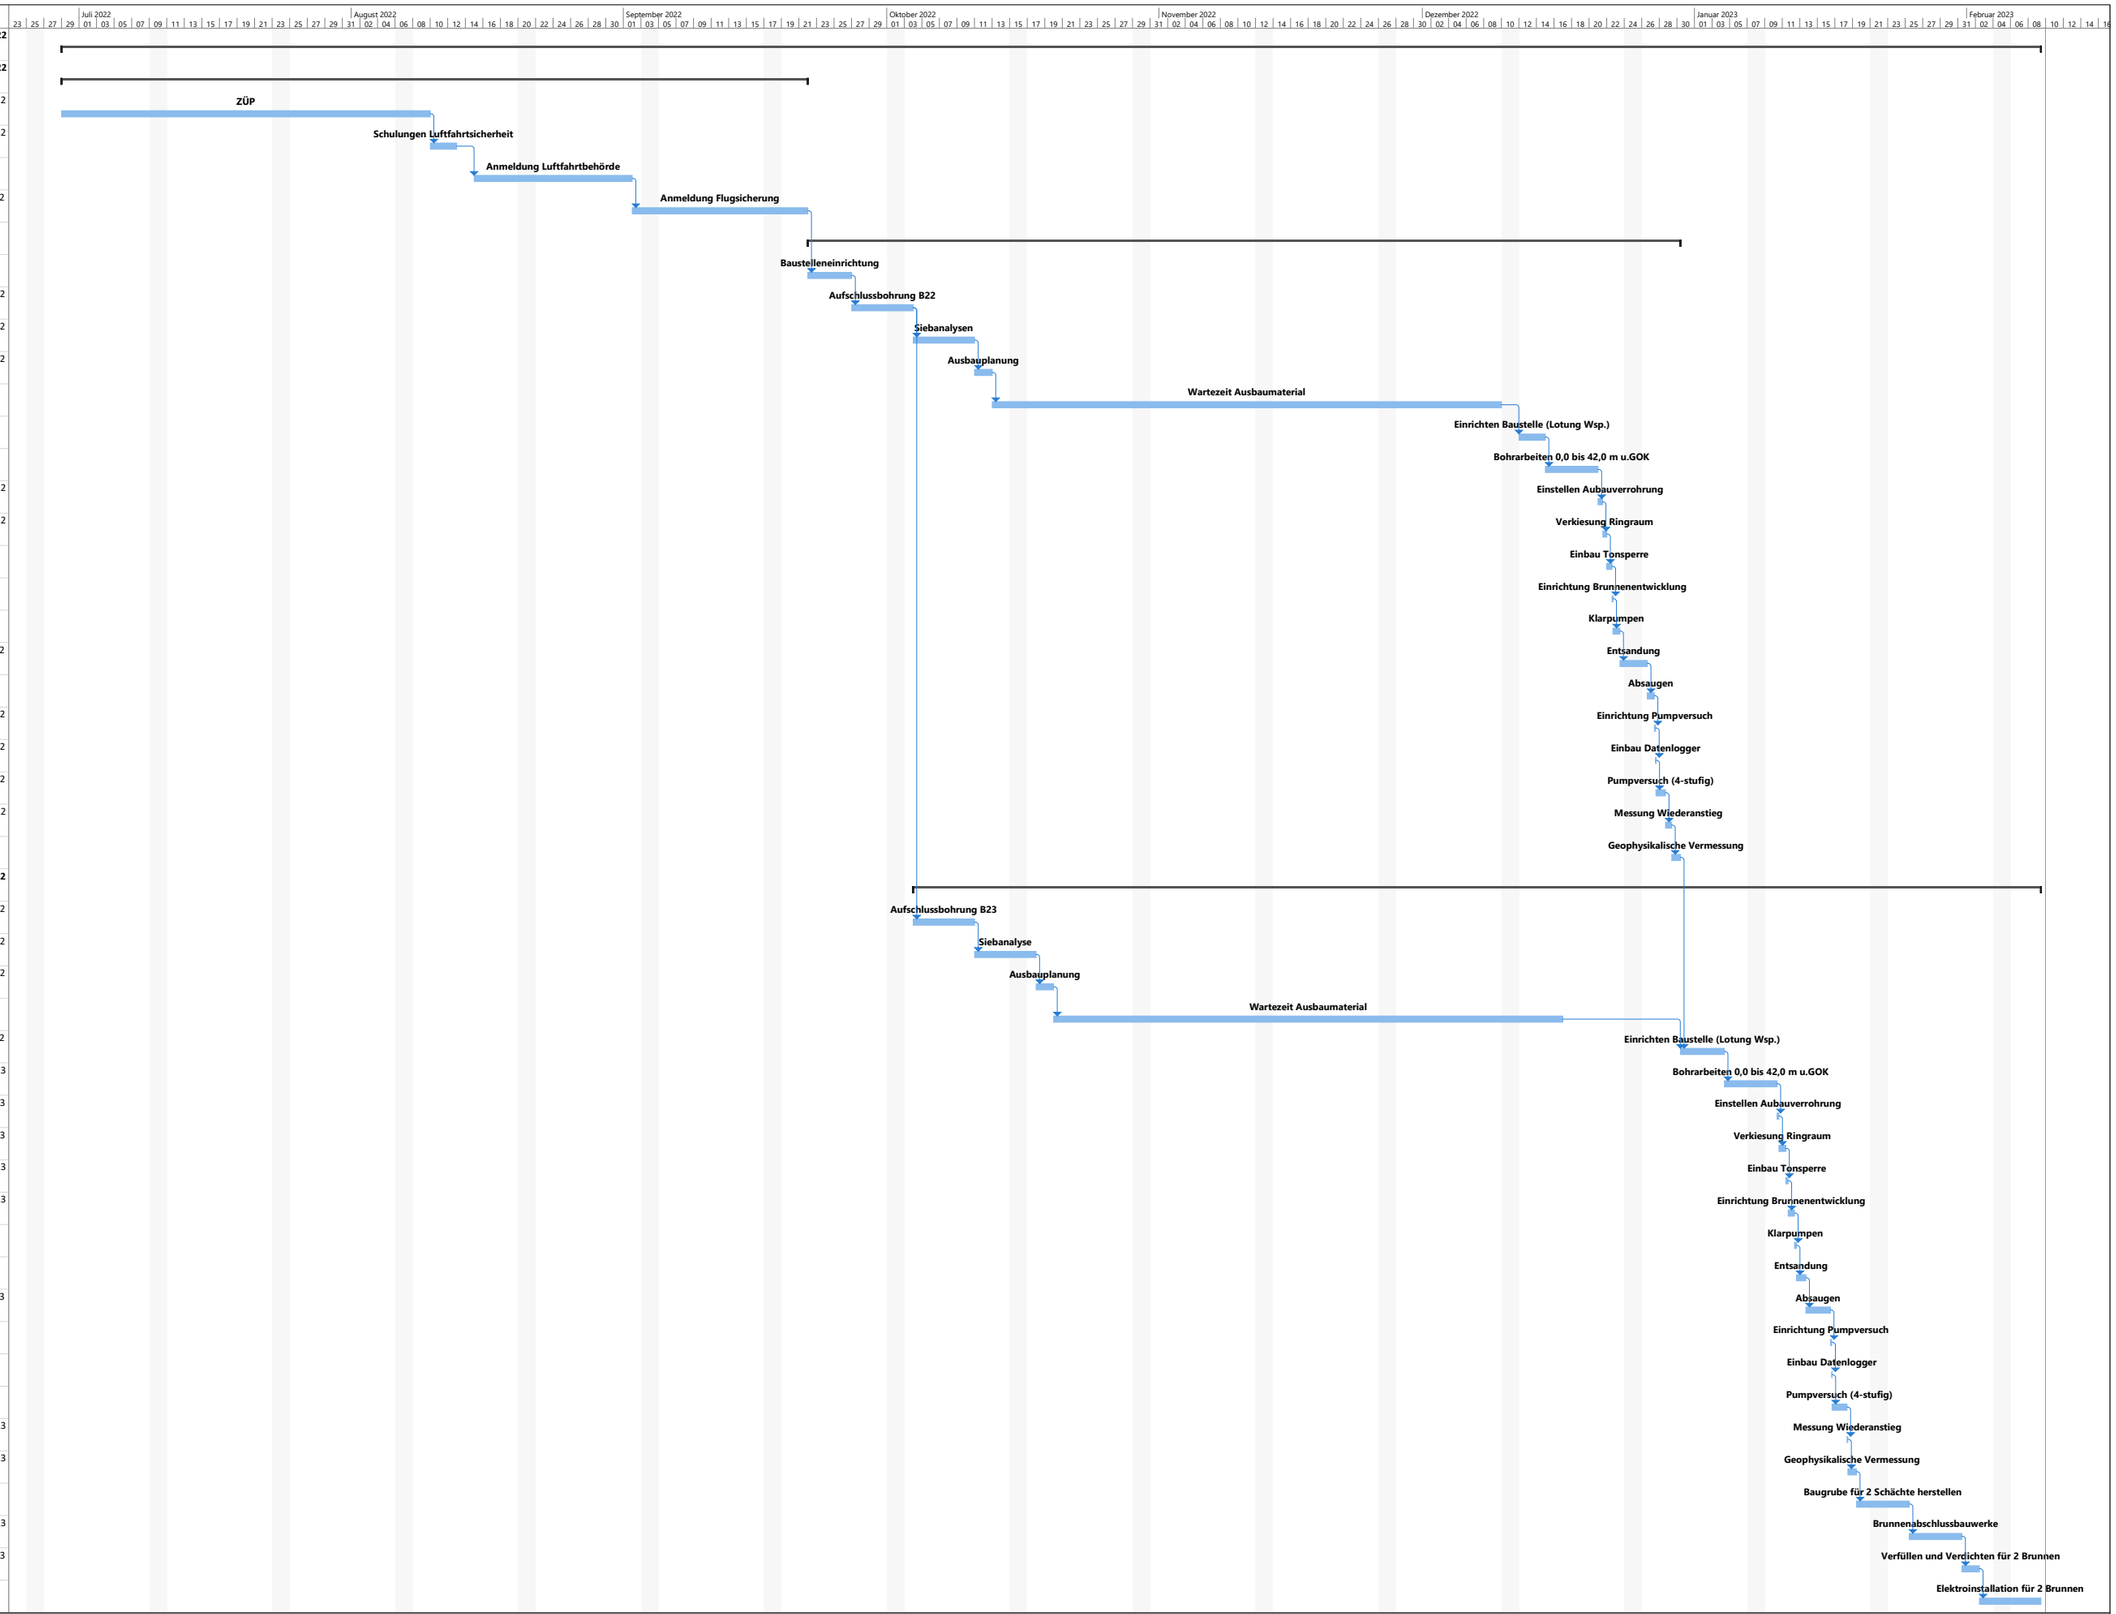

Projekt: Zeitplan_B22
Datum: Mit 23.03.22

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
